



Programa de Desarrollo de Liderazgo y Gerenciamiento

MÓDULO 6: GESTIÓN DE PROYECTOS Y TRABAJO ÁGIL

- Fundamentos de gestión de proyectos para gerentes.
- Priorización estratégica y gestión del tiempo eficiente.
- Técnicas de productividad y optimización de flujos de trabajo.

Mg. Lic. Jaime Íber Alfaro Aliaga

Módulo 6

Gestión de proyectos, prioridades y cuellos de botella

Gestionar no es hacer más tareas.
Es identificar qué resultado importa, qué recurso lo limita y qué
decisión puede destrabar el avance.






De la urgencia al criterio gerencial

Un mando medio agrega valor cuando deja de mirar solo "lo que hay que hacer"

y empieza a mirar:

qué se quiere lograr, dónde se traba el sistema y cómo ordenar prioridades para que el resultado avance.

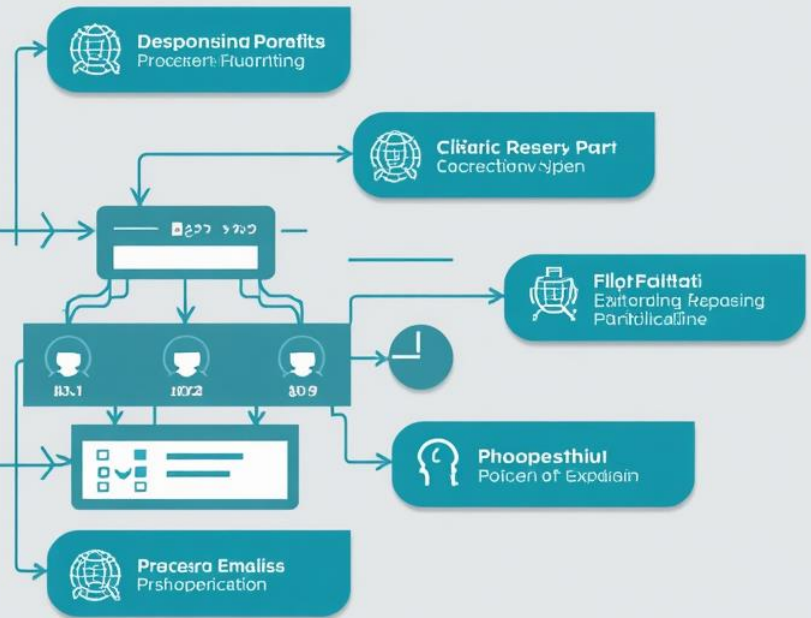



ESTUDIEMOS UN CASO PARA PRACTICAR – ATENCIÓN A NIÑOS CON DESNUTRICIÓN

- secuencia real del proceso
 - recursos que intervienen
 - tiempos y esperas
 - cuellos de botella
-
- El objetivo no es hacer ingeniería de procesos. Es tener una imagen clara de cómo funciona una operación y dónde se vuelve frágil



Unidad de flujo del ejemplo

- Necesitamos definir una unidad de análisis. En este caso no es una familia ni una jornada completa: es un niño en una visita de control.
- La idea de fijar límites del proceso, unidad de flujo, red de actividades y recursos está explicitada en el esquema de arquitectura de procesos del material.

Primero veo el proceso como secuencia. Todavía no estoy viendo capacidad; solo estoy ordenando qué pasa y en qué orden

Los 9 pasos:

- Recepción y admisión
- Espera para control
- Peso y talla / mediciones
- Registro de datos
- Evaluación nutricional Emisión de orden y receta
- Entrega de suplemento
- Programación próximo control
- Cierre administrativo



Paso 1: Proceso – Diagrama de Flujo



Paso 2: Tiempos por actividad (para 1 niño)

	Actividad	Responsable	Tiempo (min)
1	Recepción y admisión	Agente sanitario	4
2	Espera para control	Agente sanitario	5
3	Peso y talla / mediciones	Agente sanitario	6
4	Registro de datos	Agente sanitario	3
5	Evaluación nutricional	Nutricionista	10
6	Emisión de orden y receta	Pediatra	8
7	Entrega de suplemento	Auxiliar administrativo	5
8	Programación próximo control	Auxiliar administrativo	3
9	Cierre administrativo	Auxiliar administrativo	2
Tiempo total de ciclo (sin esperas adicionales)			46 min

Siguiente

CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL PROCESO

PROCESO: ATENCIÓN NUTRICIONAL DE UN NIÑO EN CONIN

No. ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	OPERACIÓN	INSPECCIÓN / CONTROL	TRANSPORTE	ALMACENAMIENTO / ARCHIVO	DEMORA / ESPERA	TIEMPO MIN	OBSERVACIÓN
		q=8	q=4	q=1	q=2	q=1	46	min
								
1	Recepción y admisión	X	X				4	Ingreso del niño y datos iniciales
2	Espera para control					X	5	Espera hasta atención
3	Peso y talla / mediciones	X	X				6	Medición antropométrica
4	Registro de datos	X			X		3	Carga en planilla o sistema
5	Evaluación nutricional	X	X				10	Diagnóstico nutricional
6	Emisión de orden y receta	X	X				8	Indicación pediátrica
7	Traslado a depósito / entrega de suplemento	X		X			5	Entrega al responsable
8	Programación del próximo control	X					3	Agenda de seguimiento
9	Cierre administrativo / archivo	X			X		2	Documentación y cierre

Paso 3: Recursos del proceso



Agente sanitario/a



Nutricionista



Pediatra



Auxiliar administrativo/a



Consultorio de nutrición



Consultorio de pediatría



Balanza y tallímetro



Sistema / planilla de registro



Depósito de suplementos




Sala de espera

Notas

Cada recurso tiene una capacidad limitada.

El objetivo es ver dónde se generan esperas y cuál es el cuello de botella del proceso.

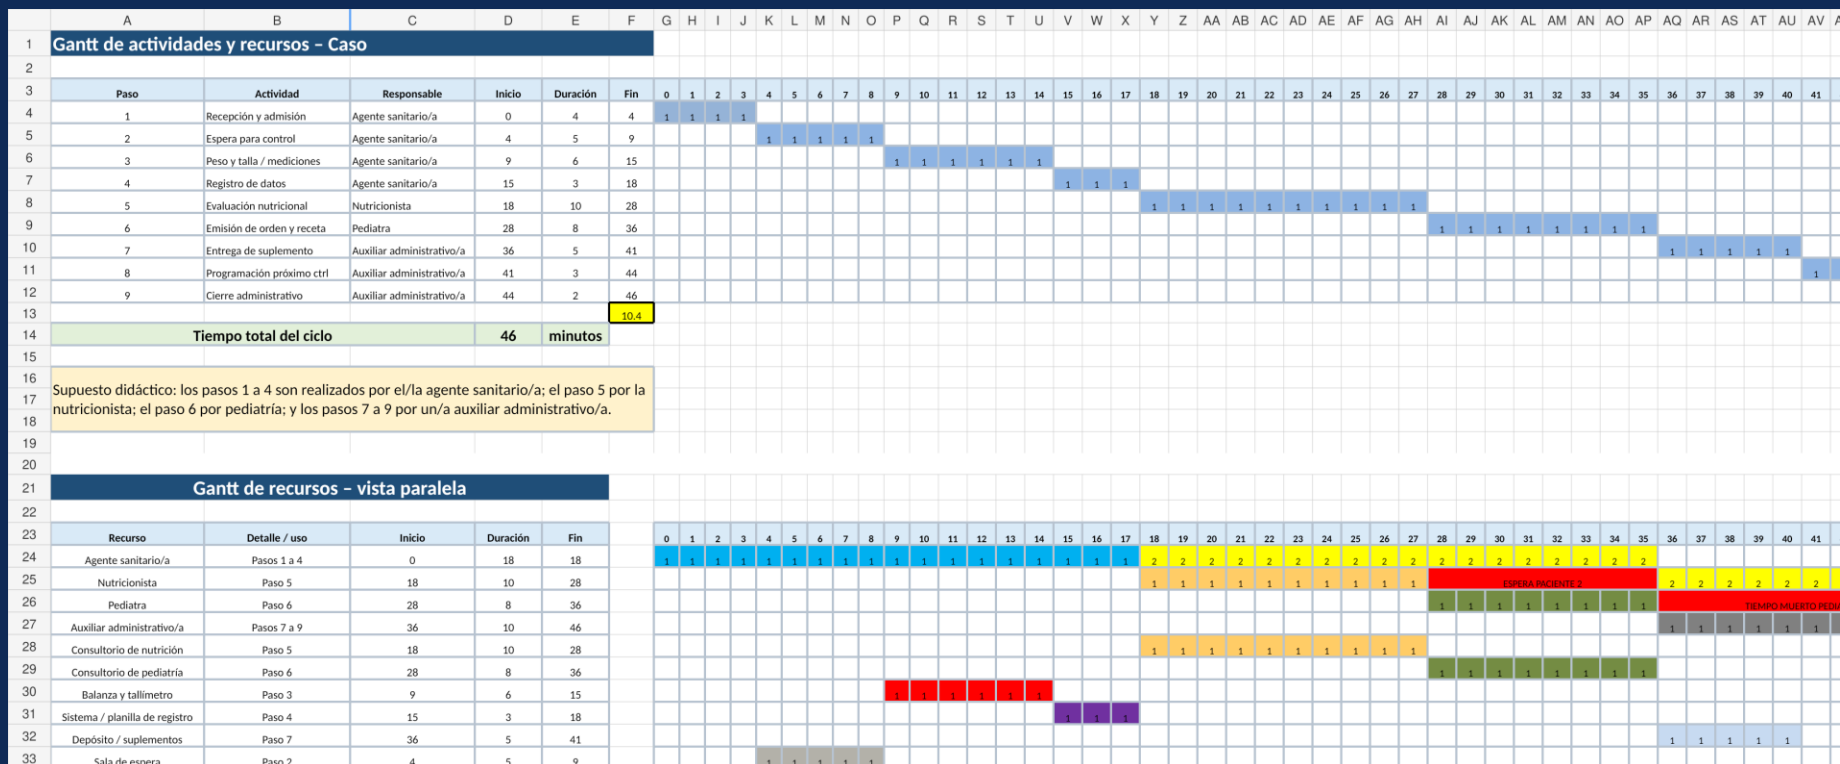

En este caso, la restricción principal no aparece tanto en pediatría ni en nutrición, sino en el tramo inicial que concentra admisión, medición y registro

- el proceso no se traba al final, se traba en el arranque
- el agente sanitario concentra cuatro actividades consecutivas
- nutrición, pediatría y administración quedan aguas abajo del ritmo que impone ese primer tramo.
- el segundo niño no puede avanzar más rápido que la disponibilidad del recurso inicial
- el cuello de botella no siempre es el recurso más caro o más especializado

CONCLUSIONES

Primero no hay que correr a comprar ni a sumar gente. Primero hay que usar mejor la capacidad que ya existe. Solo después tiene sentido elevar la restricción.

No se mejora el sistema acelerando cualquier parte; se mejora cuidando la restricción

Una hora ahorrada fuera del cuello puede no cambiar nada; una hora perdida en el cuello perjudica a todo el sistema





Puente hacia Canal 4

En Canal 4 puede pasar lo mismo. Una promoción comercial, una instalación de internet o una campaña de contenido pueden parecer procesos simples y bien ordenados.

Pero cuando miramos los recursos —técnicos, sistemas, administración, contenido, infraestructura o decisiones de dirección— aparece dónde se traba realmente el resultado.



Actividad breve para hoy

Elijan un proceso real de Canal 4 que involucre varias áreas (ej.: instalación de internet, promoción comercial, producción de contenido).

- 1 Identifiquen las principales etapas del proceso.
- 2 Identifiquen los recursos clave que intervienen.
- 3 Indiquen cuál creen que es el recurso que más puede estar limitando la velocidad o la capacidad del proceso (posible cuello de botella).

➔ En 10 minutos, preparen su análisis para compartirlo con el grupo.

Ejemplos para que puedan trabajar

Jefatura	Proceso posible
Ventas	Alta de nuevo cliente / promoción comercial
Cobranza	Recuperación de deuda vencida
Sistemas	Atención de pedidos internos
Infraestructura	Instalación o reparación técnica
Administración Contable	Facturación de promociones o combos
RRHH	Cobertura de puesto o turno crítico
Contenido	Producción de piezas o menciones comerciales



Elegí un caso real que hoy te genere demoras, reclamos, urgencias o problemas de coordinación.

| Tarea 1: Elegir un proceso real

Cada jefe elige un proceso de su área que hoy le genere demoras, reclamos, urgencias o problemas de coordinación.



Pregunta guía:

¿Qué proceso de tu área hoy genera demoras, reclamos, urgencias o problemas de coordinación?



Proceso elegido:



Resultado esperado:



Áreas involucradas:

Tarea 2: Describir las etapas principales

No hace falta que sea perfecto. La idea es visualizar el flujo.

Etapa	Qué se hace	Área o responsable
1		
2		
3		
4		
5		

Tarea 3: Identificar recursos críticos

Ahora no miren solo las tareas. Miren los recursos.

- personas
- técnicos
- sistemas
- información
- equipos
- vehículos
- materiales
- aprobaciones
- tiempo de dirección
- grilla o espacios de contenido
- datos administrativos

Recurso crítico	¿Quién lo usa?	¿Puede saturarse?	¿Qué pasa si no está disponible?

Tarea 4: Detectar el cuello de botella



¿Cuál es el recurso que más puede limitar la velocidad o capacidad del proceso?

Proceso elegido	Posible cuello de botella	Consecuencia

Ejemplos:



Técnicos saturados → se demoran instalaciones



Sistemas saturado → se demoran reportes o cargas



Administración saturada → se demoran facturaciones correctas



Contenido saturado → se demoran campañas

Tarea 5: Definir una decisión gerencial

No alcanza con detectar el problema. Hay que proponer una decisión.

Cuello de botella	Decisión posible	Impacto esperado
Técnico instalador saturado	Reprogramar prioridades / validar zonas antes de vender	Menos demoras y reclamos
Contenido saturado	Priorizar piezas con impacto comercial	Menos retrabajo y más cumplimiento
Administración con promociones poco claras	Crear ficha mínima antes de lanzar promociones	Menos errores de facturación
Sistemas saturado	Ordenar pedidos por impacto operativo	Menos urgencias improductivas

Consigna final

- 1 Proceso elegido
- 2 Resultado esperado
- 3 Etapas principales
- 4 Recursos críticos
- 5 Posible cuello de botella
- 6 Decisión que podría destrabar



Pregunta final: ¿Qué recurso, información o decisión está limitando hoy la velocidad del proceso?
